セントラヴィ様 HP制作スケジュール

プロジェクト開始日： 2020/2/17 | 1 日単位

«スケジュールの凡例»
■ … 予定　⟷ … 実績

作業	担当	今週実績	開始 (予定)	開始 (実績)	終了 (予定)	終了 (実績)
【サイトマップ・ワイヤーフレーム】						
サイトマップ・コンテンツ概要・ベースワイヤーフレーム	Medical		2/17		2/21	
医院様確認	医院様		2/25		3/1	
修正	Medical		3/2		3/3	
【デザイン】						
ベースデザインPC表示（トップ）	Medical		3/4		3/9	
社内チェック	Medical		3/9		3/9	
修正・ベースデザイン（下位1P）+スマホ表示（トップ）	Medical		3/10		3/12	
社内チェック	Medical		3/12		3/12	
修正	Medical		3/13		3/16	
医院様確認	医院様		3/16		5/11	
修正（軽微な修正はコーディングで対応）	Medical		5/12		5/13	
社内チェック	Medical		5/14		5/15	
修正	Medical		5/18		5/18	
医院様確認	医院様		5/19		5/21	
【原稿作成】						
原稿制作	Medical		3/4		3/19	
社内チェック	Medical		3/23		4/6	
医院様確認	医院様		4/7		5/11	
修正	Medical		5/12		5/21	
【ページ制作（コーディング）】						
CMSテンプレート	Medical		4/1		4/9	
CMSテンプレート修正	Medical		4/10		4/13	
社内チェック	Medical		4/10		4/13	
下層ページコーディング	Medical		4/14		5/1	
社内チェック	Medical		4/20		5/1	
トップデザイン・原稿の修正反映			5/22		5/26	
社内チェック	Medical		5/27		5/28	
修正	Medical		5/29		6/1	
テスト掲載	Medical		6/1		6/1	
全ページご確認・チェックバック	医院様		6/1		6/5	
修正	Medical		6/8		6/12	
社内チェック	Medical		6/15		6/16	
最終確認・チェックバック	医院様		6/17		6/18	
最終修正・本掲載準備	Medical		6/19		6/23	
【CMS構築】						
CMS構築	Medical		4/27		5/12	
社内チェック	Medical		5/13		5/19	
修正	Medical		5/20		5/22	
データ流し込み	Medical		5/25		5/29	
【本掲載】						
本掲載	Medical		6/24		6/24	

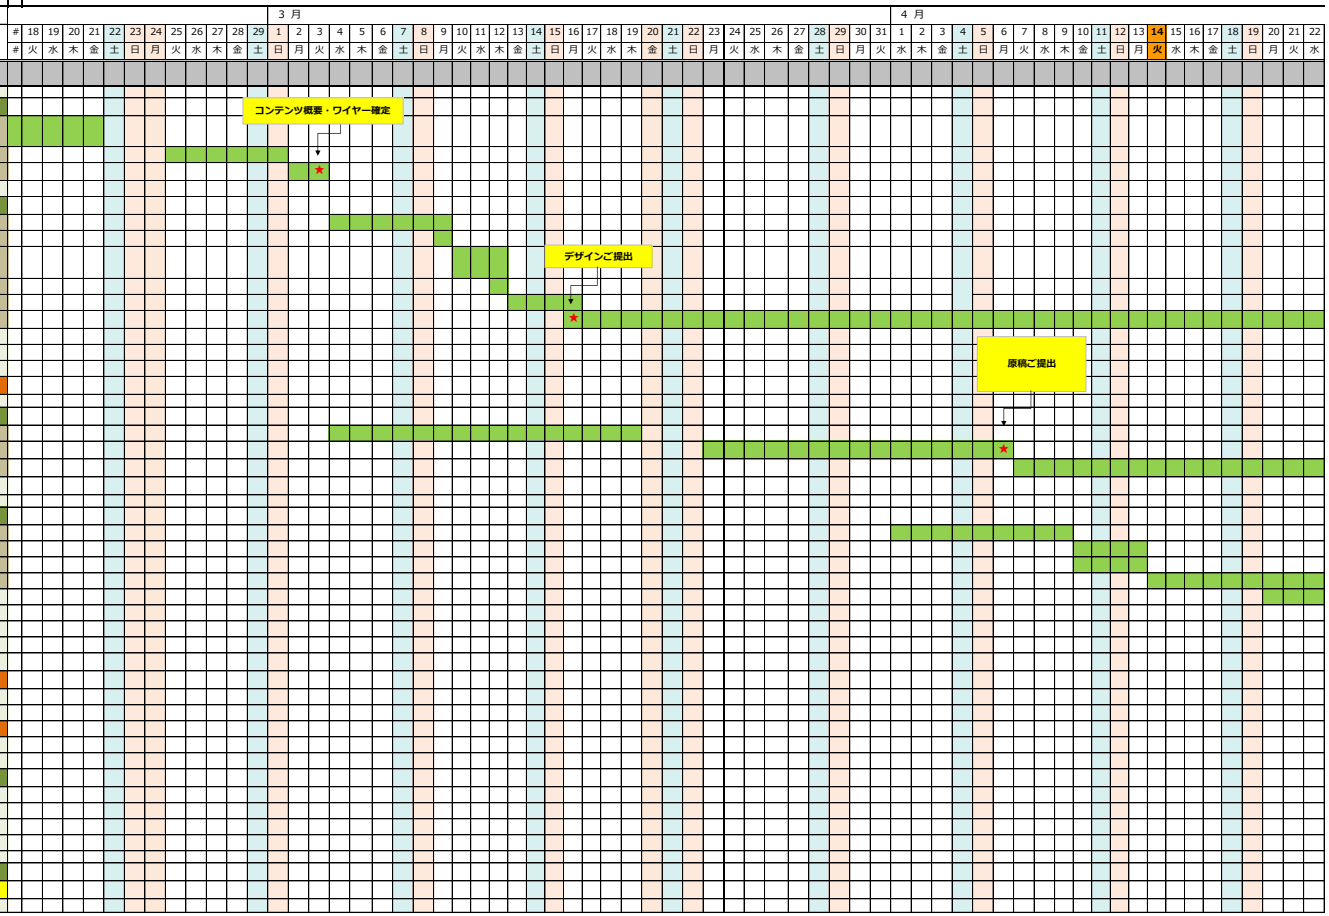

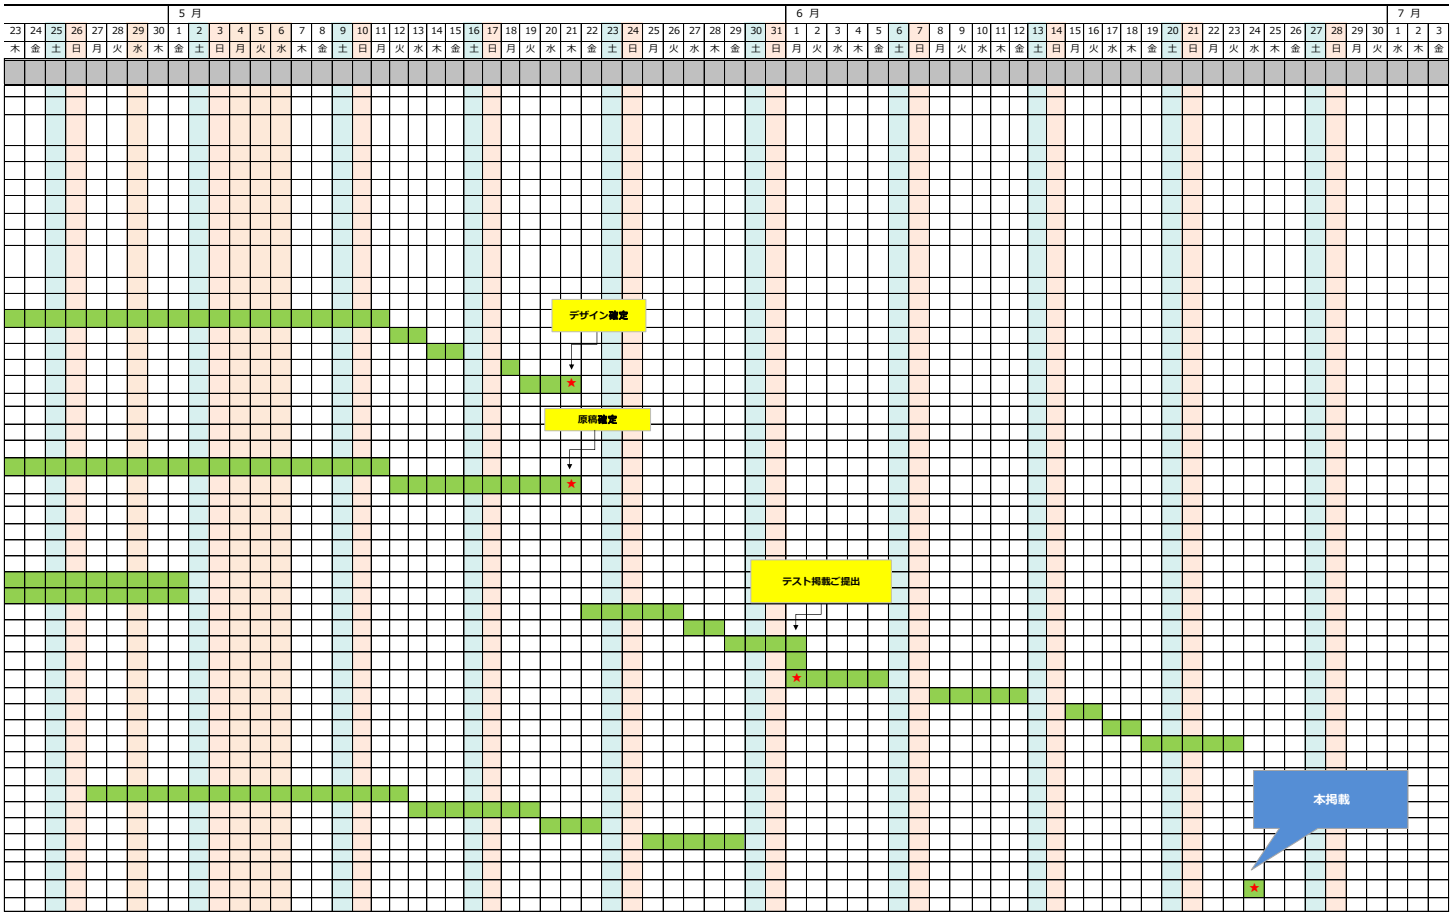
5 月
6 月
7 月
デザイン確定
原稿確定
テスト掲載ご提出
本掲載
