セントラヴィ様 HP制作スケジュール

プロジェクト開始日： 2020/2/17 日単位

＜スケジュールの凡例＞
■ ・・・予定　━ ・・・実績
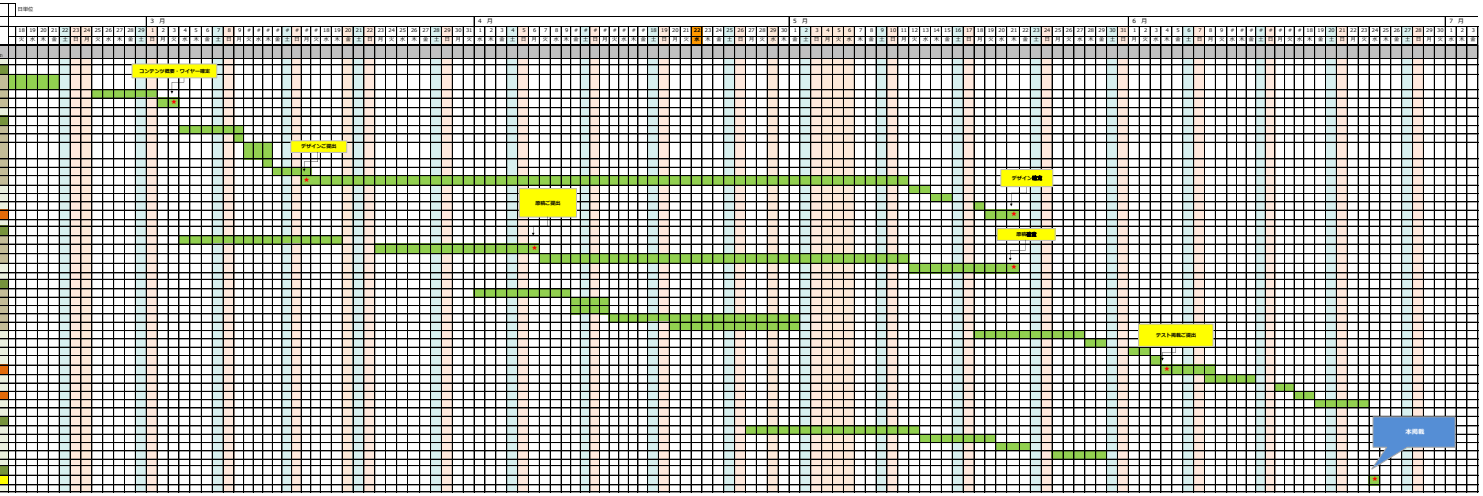
作業	担当	作業期間 開始	終了	実績 開始	終了
【サイトマップ・ワイヤーフレーム】					
サイトマップ・ワイヤー作成 →ベースサーバー	Medical	2/17	3/23		
クロージング確認	クロージング	2/27	3/1		
修正	Medical	3/2	3/3		
【デザイン】					
ベースデザインPC表示（トップ）	Medical	3/4	3/9		
社内チェック	Medical	3/5	3/9		
修正・ベースデザイン（下位1P）+スマホ表示（トップ）	Medical	3/10	3/12		
社内チェック	Medical	3/12	3/12		
修正	Medical	3/13	3/16		
トンマナ 3-4	トンマナ	3/11	3/13		
修正（細部な修正はコーディングで対応）	Medical	5/12	5/13		
社内チェック	Medical	5/14	5/15		
修正	Medical	5/18	5/18		
トンマナ 5-6	トンマナ	5/11	5/21		
【コーディング】					
並列制作	Medical	3/4	3/19		
社内チェック	Medical	3/20	4/6		
トンマナ 5-6	トンマナ	4/7	4/13		
修正	Medical	5/12	5/21		
【ベータ版（ローディング）】					
CMSテンプレート	Medical	4/1	4/9		
CMSテンプレート修正	Medical	4/10	4/13		
社内チェック	Medical	4/13	4/13		
下層ページコーディング	Medical	4/14	5/1		
社内チェック	Medical	4/20	5/21		
トップデザイン・面積の修正反映		5/18	5/27		
社内チェック	Medical	5/28	5/29		
修正	Medical	6/1	6/2		
社内処理	Medical	6/3	6/3		
ベータページ トンマナバック	トンマナ	6/4	6/8		
修正	Medical	6/8	6/12		
社内チェック	Medical	6/13	6/16		
当社修正 最終チェックバック	トンマナ	6/17	6/18		
顧客様 本番反映	Medical	6/19	6/23		
【CMS作成】					
CMS構築	Medical	4/27	5/12		
社内チェック	Medical	5/13	5/19		
修正	Medical	5/20	5/22		
データ差し込み	Medical	5/25	5/29		
【本番用】					
本開設	Medical	6/24	6/24
